Zeitplan Bau touristisches Informationszentrum

Ringheiligtum Pömmelte *Stand: 07.09.2020*

Hervorgehobener Zeitraum: Sep | Dauer des Plans | Tatsächlicher Start | % abgeschlossen | Tatsächlich (hinter dem Plan) | % abgeschlossen (hinter dem Plan)

AKTIVITÄT	START DER AKTIVITÄT	DAUER DER AKTIVITÄT	TATSÄCHLICHER START	TATSÄCHLICHE DAUER	PROZENT ABGESCHLOSSEN
TIZ(GRW)					
Entwicklung Idee / Standort Multifunktionsbau	Sep 17	Dez 17			100%
Entscheidung Standort Infozentrum / Erarbeitung Anforderungen Haus	Jan 18	Mrz 18			100%
Ausschreibung Planung Infozentrum	Mrz 18	Apr 18			100%
Vorstellung Stegreifentwurf	11. Jun 18	11. Jun 18			100%
Zusage Planer Sußmann	31. Jul 18	31. Jul 18			100%
Erstellung Fördermittelantrag GRW	Aug 18	Dez 18			100%
Einreichung Fördermittelantrag GRW	13. Dez 18	13. Dez 18			100%
Zeitraum bis zum Zuwendungsbescheid Fördermittelantrag GRW	13. Dez 18	16. Okt 19			100%
Umplanungen wegen Kellererweiterung	Nov 19	Feb 20			100%
Erarbeitung Nutzungskonzept Ringheiligtum Pömmelte	Nov 19	Jun 20			95%
Erstellung Unterlagen Bauantrag Informationszentrum	Dez 19	Apr 20			100%
Beantragung + Erteilung Hausnummer Ringheiligtum	Mrz 20	Mrz 20			100%
Einreichung Bauantrag und Genehmigung	Apr 20	Jul 20			100%
Architekturstudie Ringheiligtum + Rituallandschaft	Apr 20	Jul 20			20%
Ausschreibung + Vergabe Bau Wasserleitung	Mai 20	Jul 20			100%
Erweiterung Elektroanschluss für das Ringheiligtum	Mai 20	Jul 20			100%
Bau Wasserleitung	Jun 20	Sep 20			70%
Bau Grundleitungen (Wasserhaltung Baustelle)	Jun 20	Sep 20			0%
erneute Ausschreibung Vergabe Keller	Sep 20	Sept/Okt 20			50%

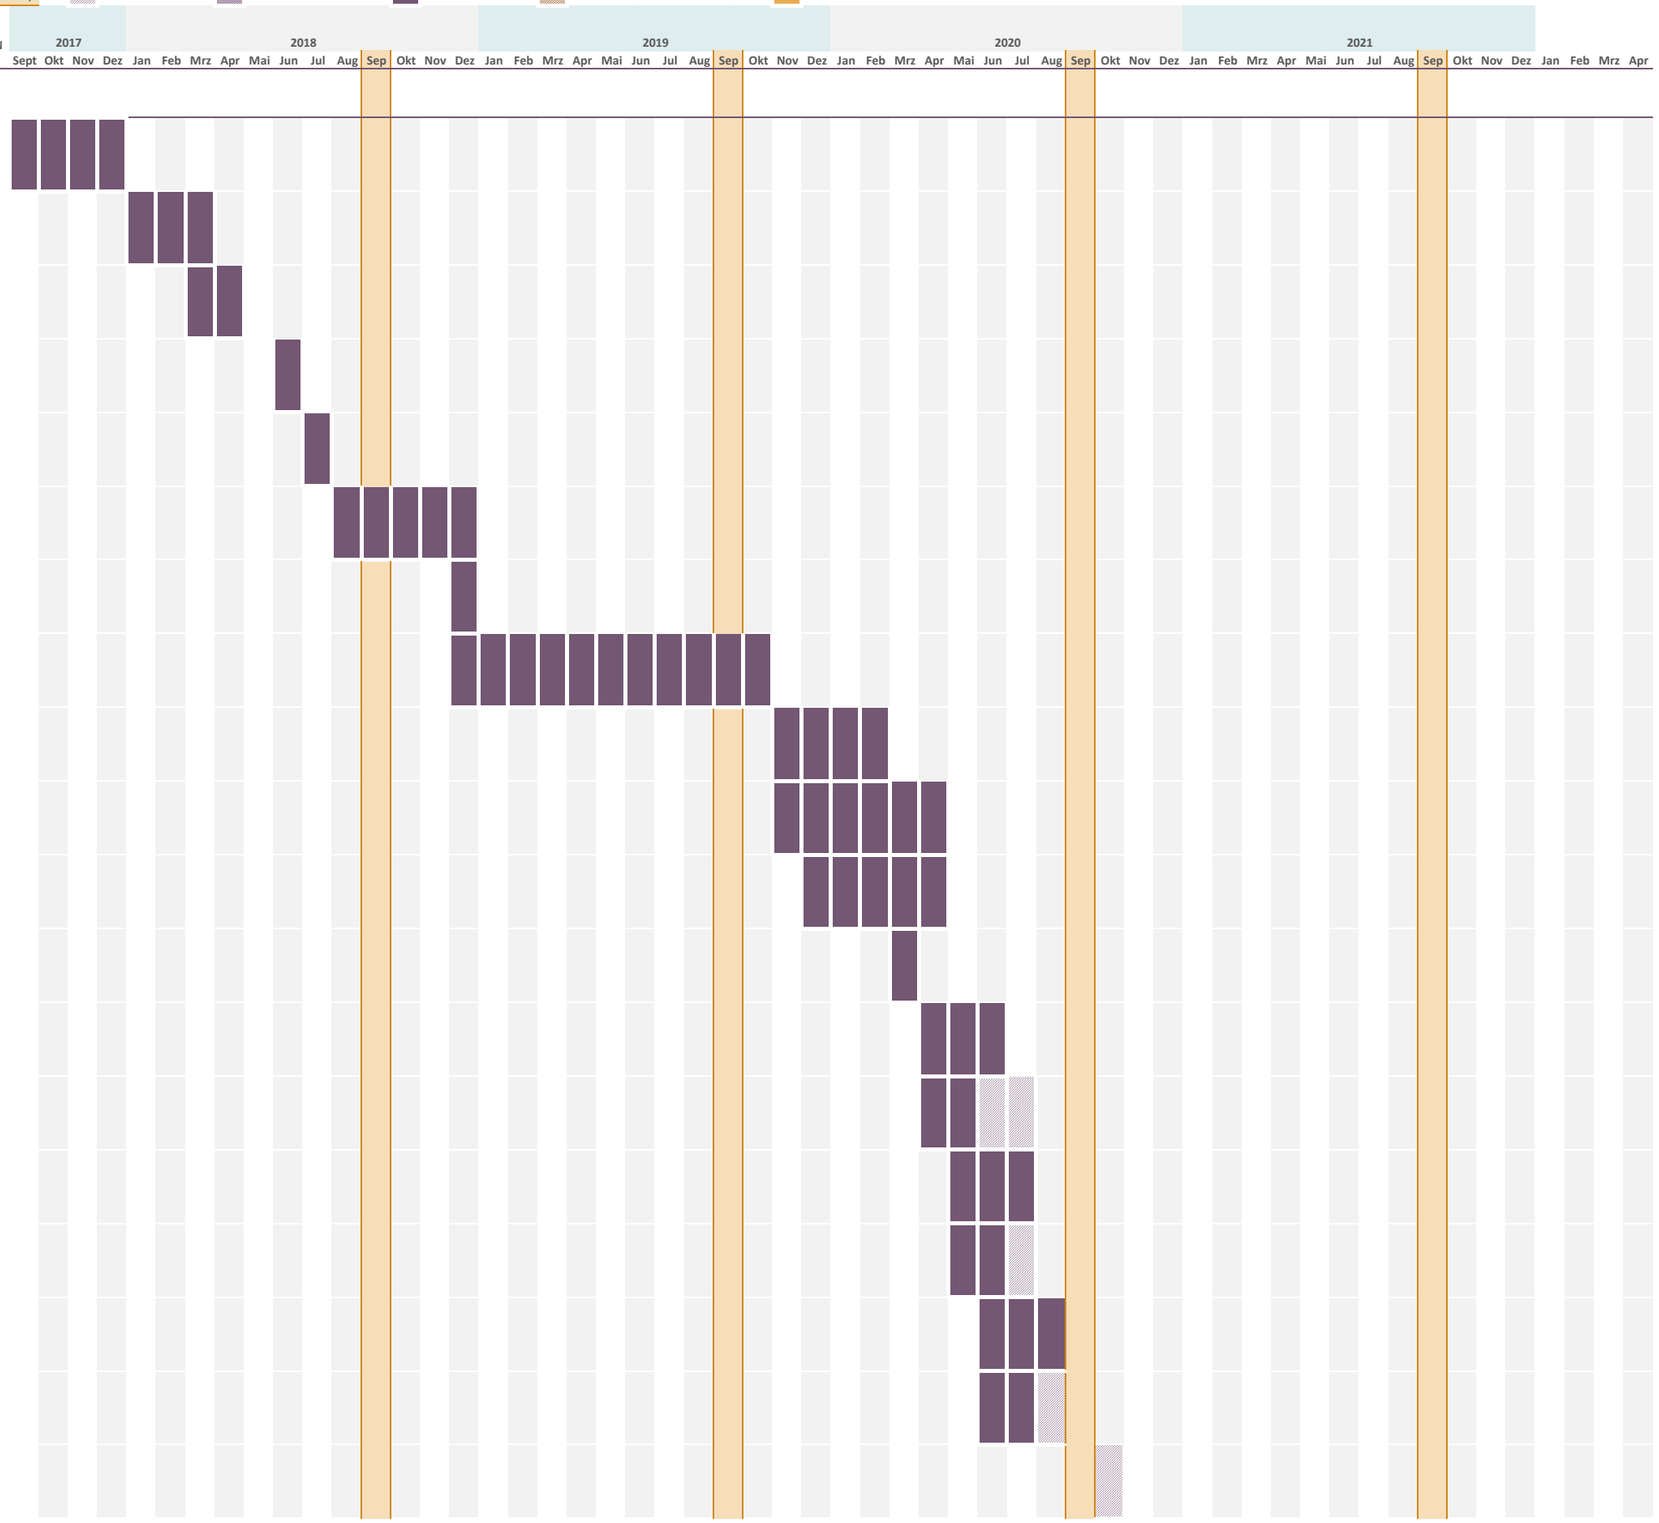

AKTIVITÄT	START DER AKTIVITÄT	DAUER DER AKTIVITÄT	TATSÄCHLICHER START	TATSÄCHLICHE DAUER	PROZENT ABGESCHLOSSEN
1.Spatenstich Bau touristisches Informationszentrum	22. Jul. 20	22. Jul. 20			100%
Bau Keller + Fundamentierung	Okt 20	Feb 21			5%
Bau Bodenplatte Decke	Feb 21	Mrz 21			0%
erneute Ausschreibung + Vergabe Abwasser- und Löschwasserbehälter	Sep 20	Okt 20			50%
Bau Sammelgrube + Löschwasserbehälter	Nov 20	Apr 21			0%
Ausschreibung + Vergabe Lehm + Dach	Aug 20	Okt 20			30%
Bau Lehm	Mrz 21	Jun 21			0%
Ausschreibung + Vergabe Ausbaugewerke, Installation, Außengelände	Nov 20	Feb 21			0%
Bau Ausbaugewerke, Dach, Außengelände	Jun 21	Dez 21			0%
Digitalisierung/information/Kommunikation/Technik (DIKT)					
Erarbeitung Konzept IT Informationszentrum zur Fördermittelantragstellung	Mrz 19	Aug 19			100%
Übersendung Fördermittelantrag IT an Staatskanzlei	Aug 19	Aug 19			100%
Vorabstimmungen mit der Staatskanzlei LSA und Kontaktaufnahme mit der Bundestagsabgeordneten Fr. Lips	Nov 19	Dez 19			100%
erste Abstimmungen und Übersendung des Antragsvordruck für die geplante Bundesförderung durch das BKM	16. Dez 19	16. Dez 19			100%
Übersendung Antrag auf Gewährung einer Projektförderung durch BKM zur „Förderung von kulturellen, (inter-) national bedeutsamen Vorhaben	29. Jan 20	29. Jan 20			100%
Erarbeitung Hintergrund für Ausschreibung „Ideenwettbewerb IT-Planung“ durch StS 07	3. Feb 20	3. Feb 20			100%
Übersendung Antrag „Notwendige Ausstattung des Ringheiligtum Pömmelte mit einer leistungsfähigen, zeitgemäßen und zukunftsfähigen IT-Infrastruktur“ an das LVWA LSA inkl. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn	4. Feb 20	4. Feb 20			100%
1. Änderung Kostenplan und Übersendung an BKM und LVWA	14. Feb 20	14. Feb 20			100%
2. Änderung Kostenplan und Übersendung an BKM und LVWA	25. Feb 20	25. Feb 20			100%

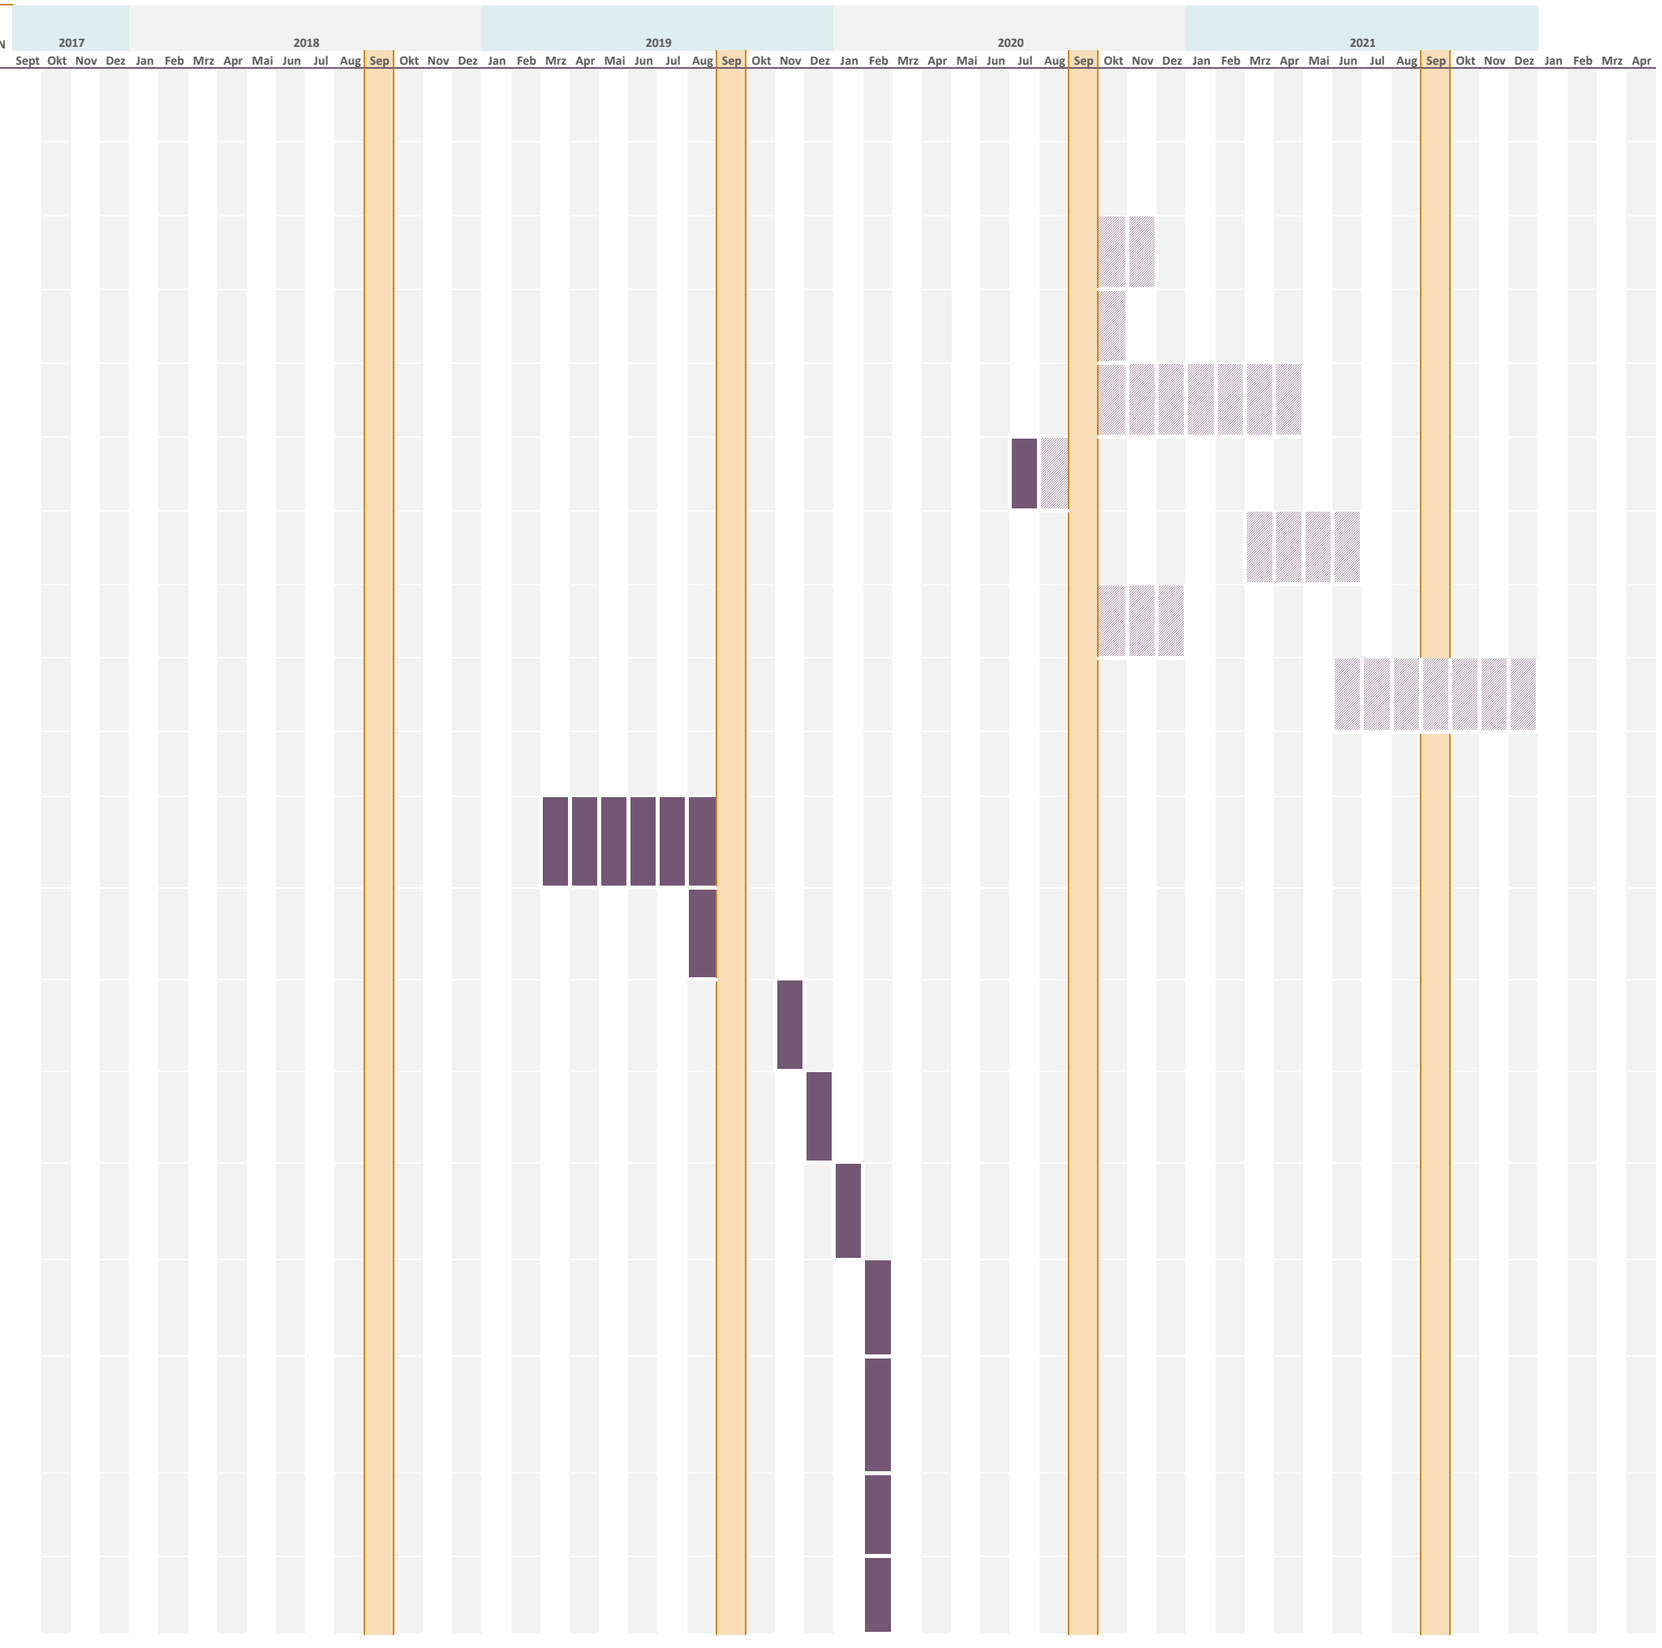
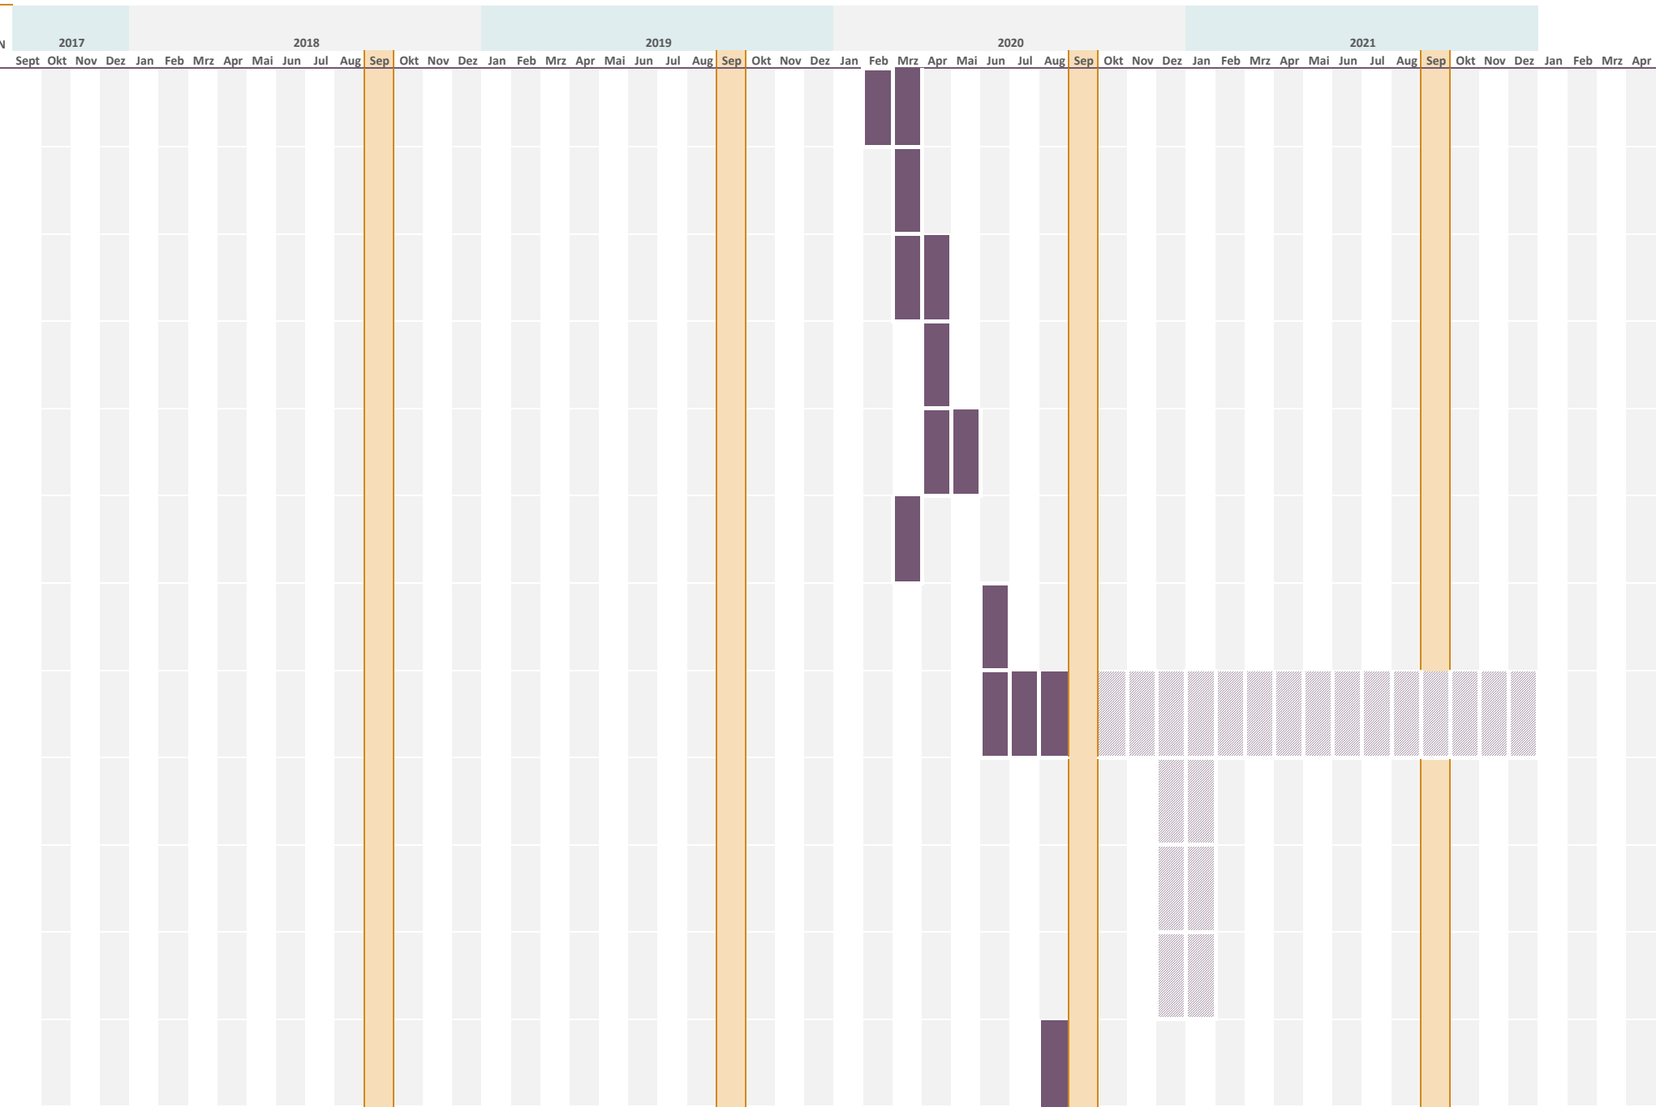
AKTIVITÄT	START DER AKTIVITÄT	DAUER DER AKTIVITÄT	TATSÄCHLICHER START	TATSÄCHLICHE DAUER	PROZENT ABGESCHLOSSEN
Markterkundung Planungsbüros IT durch STS07	Feb 20	Mrz 20			100%
Rückmeldung und Rückfragen durch LVWA	2. Mrz 20	2. Mrz 20			100%
Übersendung Nachforderungen durch SLK	Mrz 20	Apr 20			100%
Bearbeitung + Genehmigung durch LVWA VZM	Apr 20	Apr 20			100%
Zeitraum bis zur Genehmigung Fördermittelantrag IT	Apr 20	Aug 20			100%
Erarbeitung Stellenprofil Projektstelle IT	Mrz 20	Mrz 20			100%
Einstellung Mitarbeiter Projektstelle	Jun 20	Jun 20			100%
Umsetzung der Inhalte des Projekts	Jun 20	Dez 21			20%
Vorbereitung der Ausschreibung/Erarbeitung Beleuchtungs- und Beschallungskonzeptfür das TIZ und den Außenbereich Ringheiligtum	Dez 20	Jan 21			20%
Vorbereitung der Ausschreibung/Erarbeitung Sicherheitskonzept touristisches Informationszentrum	Dez 20	Jan 21			20%
Vorbereitung der Ausschreibung/ Erarbeitung Konzept zum Informations- und Kommunikationsmanagement	Dez 20	Jan 21			20%
Übergabe des Fördermittelbescheides	Aug 20	Aug 20			100%
